


香陵公園周辺整備のお知らせ

日頃より市政にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
香陵アリーナの建設を含む香陵公園周辺整備につきましては、現在、民間活力を活用したPFI事業として取組みを進めております。

【第Ⅲ期工事について】

第Ⅲ期工事エリア、各工区のスケジュールは以下のとおりです。

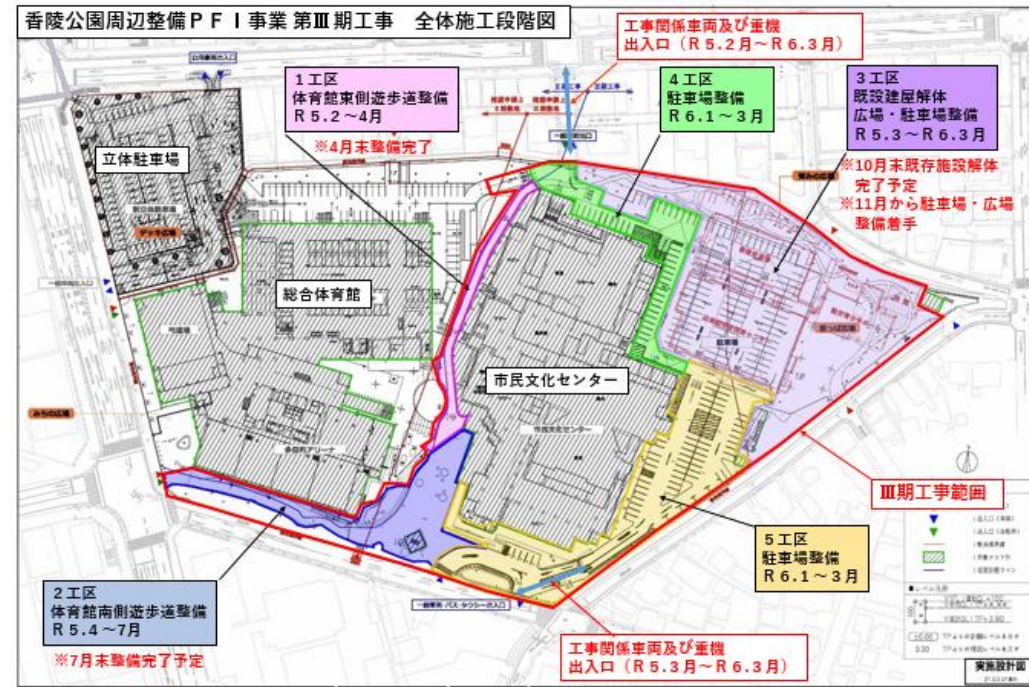

【工事の進捗状況について】

香陵アリーナ東側遊歩道の整備(1工区)が完了しました。

香陵アリーナ南側遊歩道・市民文化センター西側広場の整備(2工区)は、7月末に完了予定です。既存建屋等の解体等(3工区)は、10月末まで続きます。



※令和5年6月16日撮影

【迂回路について】

第Ⅲ期工事期間中の迂回路は以下のとおりです。



【工程について】

第Ⅲ期工事の2工区、3工区の工程は以下のとおりです。(令和5年10月までのスケジュール)
工事期間中、通行止めによる迂回やご利用の制限、解体工事による騒音や振動など近隣にお住まいの皆様には、長期にわたりご不便とご迷惑をおかけしております。
安全には十分に留意してまいりますので、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

工事スケジュール (R5年10月まで)				
	R5.7	R5.8	R5.9	R5.10
2工区 (南遊歩道)	舗装工事	通行可能		
3工区				
既存建屋解体				
勤労者体育センター	基礎解体		杭抜き	
香陵武道場		基礎解体	杭抜き	
旧青少年ホーム		上屋解体	基礎解体	
その他				付属物解体

※8/12~8/20は休工です
